
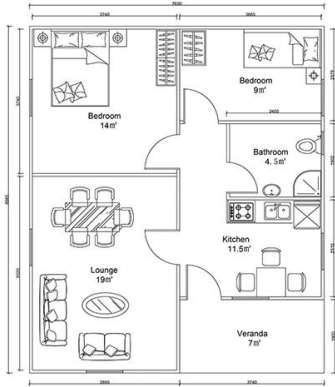


Ürün Açıklaması

Heya-2Q07



PROJECT NO.	HY-2-Q07	DATE				
NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m²	69	1	T	2.28
fittings		set	69	1	m²	69.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	151	1.15	pc	60.30
External wall unidirectional breath paper		m²	158.98	1.2	m²	190.78
External wall metal carved board	381*3800*16mm +381*4500*16mm	m²	151	1.15	m²	173.65
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	166.5	1.12	pc	64.75
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	166.5	1.12	pc	64.75
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	57.42	1.12	pc	22.33
Insulation System						
Glasswool insulation	T75mm, 12 m³/roll 16Kg/m3	m²	187.46	1.1	roll	17.18
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m³/roll 16Kg/m3	m²	76.3	1.1	roll	6.99
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	151	1.05	pc	220.21
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m²	96.656	1.15	pc	38.60
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m³/roll	m²	96.656	1.2	roll	5.80
Roof tile	asphalt tile	m²	96.656	1.2	pack	41.42
Roof ridge tile	asphalt tile	m	8.63	1.1	pack	1.19
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	39.66	1.1	pc	7.27
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	39.66	1.1	pc	10.91
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	26.83	1.2	pc	22.36
Door & Window						
PVC window		m²	7.98	1	m²	7.98
PVC door		m²	9	1	m²	9.00
Accessories for door sill/window sill	1220*2440*10mm	m	54.6	1.1	pc	4.17
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	69	1	m²	69.00
Electric system	Include weak current,exclude socket/switch/light.etc.	m²	69	1	m²	69.00
Decoration Accessories System						
Hardware Accessories System		m²	69	1	m²	69.00
TOTAL EXW cost				\$13,988.06		
TOTAL FOB Qingdao				\$14,888.06		
TOTAL CIF XX				\$16,962.51		

Őirket tanıtımı

Shandong Heya Company, in'in en iyi prefabrik konut özümü tedarikçisidir.

Ürünlerimiz prefabrik ev, konteyner ev, mobil evler, villalar, hafif elik yapı içerir.

Sektörde 10 yıldan fazla tecrübeye, profesyonel üretim ve tedarik ekibine sahibiz.

Birok tanınmış üreticiyle uzun vadeli işbirliğine dayalı bir ilişki sürdürmek.

Zimbabwe Prefabrik Sınıf Projesi, Almanya Mülteci konteyner ev projesini Őimdiden bitirdi,

Güney Afrika Prefabrik Ev, Uruguay Prefabrik Köy Evleri Evi projesi vb.

Őirketimiz güvenilir ortağınız olmayı taahhüt eder, uzmanlık alanınıza odaklanırsınız, geçici bir ofis ve kapsamlı bir özümün deposu ile başa ıkmanıza yardımcı olalım.



Fabrikamız Weifang, Shandong güzel uçurtma başkenti bulunmaktadır.

Son yıllarda fabrika gücü büyümekte ve gelişmektedir.

ve üretim gücü ve kaliteli hizmetleri, dünyanın dört bir yanından müşterilerimizin övgüsünü kazandı.

Fabrikayı ziyaret etmek ve ürünün kalitesini kontrol etmek için her müşteriye hoş geldiniz.

sertifika



" Kalite ve Hizmet " e odaklanın, tek durak hizmet, maliyetten tasarruf etmenize, tüm endişelerinizi azaltmanıza ve mükemmel projeyi devretmenize yardımcı olur.

A. Profesyonel tasarım ve mühendislik ekibi: Çelik yapı tasarımı için tam çözüm B.

Prefabrik binalara ait tüm malzemeler için Tedarik ve İmalat.

Tüm malzemelerin iyi kalitede olduğundan emin olmak için profesyonel bir tedarik ekibimiz var.

Fabrikamızın yüksek teknolojiyle çalıştığından emin olmak için ISO / CE / SGS standardı altında fabrikamız çalışmaktadır.

C.Site yönetimi ve Kurulum denetimi, Kurulum denetimine yardımcı olmak için mühendislerimizi gönderebiliriz,

normal inşaat işlerinin normal olacağını bilen bir takım hazırlamanız yeterli.

Ambalaj & Kargo

Paketleme Detayları: 1, 40'HQ nakliye konteyner tarafından teslim. 2, 4'ü 1 arada düz ambalaj

Teslimat Detayları: sipariş sonra 3-20 gün



Müşterilerimiz





SSS

1, Ödeme süreniz nedir?

TT tarafından% 50 mevduat, TT tarafından konteyner yüklemeye önce% 50% dengesi;
Bakışta% 100 LC (100.000 USD üzerindeki toplam ödeme);

2, Kargo hakkında nasıl?

Malları göndermek için 40HQ konteyner kullanıyoruz; Genellikle 40HQ konteyner yaklaşık 160-180 metrekarelik evi yükleyebilir.

3, Teslim süresi?

ADEDI bağıdır, genellikle biz mevduat aldıktan sonra 10 gün civarında sevkiyat düzenleyebilirsiniz.

4, nasıl kurulur?

Genellikle kurulum çizimlerini yapacağız ve gerekirse kurulum videosunu da sağlayacağız.

5, bana ev inşa yardımcı olmak için işçi gönderebilir misiniz?

İşçilik maliyeti, güvenlik ve vize konularını dikkate alarak, personelinize rehberlik etmek ve eğitmek için bir veya iki mühendis göndermenizi öneririz.

Mühendis maaşı için uçak bileti, otel, yemek ve günlük 100USD sağlamalısınız.
