


## **Descrizione del prodotto**

## Heya-2Q06

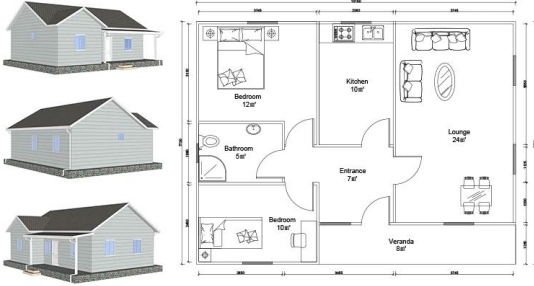

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
<b>LGS Structure</b>						
steel structure		m²	78.00	1.00	T	2.57
fittings		set	78.00	1.00	m²	78.00
<b>Wall System</b>						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	149.25	1.15	pc	59.60
External wall unidirectional breath paper		m²	158.37	1.20	m²	190.04
External wall metal carved board	381*3800*16mm +381*4500*16mm	m²	149.25	1.15	m²	171.64
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	209.30	1.12	pc	81.39
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	209.30	1.12	pc	81.39
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	70.88	1.12	pc	27.57
<b>Insulation System</b>						
Glasswool Insulation	T75mm- 12m³/roll 16Kg/m³	m²	214.72	1.10	roll	19.68
Glasswool insulation(under roof)	T75mm- 12m³/roll 16Kg/m³	m²	81.55	1.10	roll	7.48
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	149.25	1.05	pc	217.66
<b>Roof System</b>						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m²	137.10	1.15	pc	54.75
self-paste waterproof coil	Tl.5mm- -15°C- 20m³/roll	m²	137.10	1.20	roll	8.23
Roof tile	asphalt tile	m²	137.10	1.20	pack	58.76
Roof ridge tile	asphalt tile	m	15.40	1.10	pack	2.12
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	50.00	1.10	pc	9.17
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	50.00	1.10	pc	13.75
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	36.08	1.20	pc	30.07
<b>Door &amp; Window</b>						
PVC window		m²	9.12	1.00	m²	9.12
PVC door		m²	10.80	1.00	m²	10.80
Accessories for door sill/window sill	1220*2440*10mm	m	63.80	1.10	pc	4.87
<b>Water&amp;Electric System</b>						
Water Pipes		m²	78.00	1.00	m²	78.00
Electric system	include weak current exclude socket/switch/light etc	m²	78.00	1.00	m²	78.00
Decoration Accessories System		m²	78.00	1.00	m²	78.00
Hardware Accessories System		m²	78.00	1.00	m²	78.00
<b>TOTAL EXW cost</b>				\$15,968.88		
<b>TOTAL FOB Qingdao</b>				\$16,598.88		
<b>TOTAL CIF XX</b>				\$18,681.87		

## Introduzione dell'azienda

Shandong Heya Company è il miglior fornitore di soluzioni abitative prefabbricate cinesi.

I nostri prodotti comprendono case prefabbricate, case container, case mobili, ville, strutture in acciaio leggero.

Abbiamo più di 10 anni di esperienza nel settore, nella produzione professionale e nel gruppo di approvvigionamento,

mantenere relazioni di cooperazione a lungo termine con molti noti produttori.

Ho già terminato il progetto di una casa container per rifugiati in Germania, un progetto prefabbricato in classe per lo Zimbabwe,

Casa prefabbricata del Sudafrica, progetto della casa prefabbricata dei villaggi dell'Uruguay e così via.

La nostra azienda si impegna a diventare il tuo partner di fiducia, ti concentri sulla tua area di competenza,

permettici di aiutarti a gestire l'ufficio temporaneo e il magazzino di una soluzione completa.



La nostra fabbrica si trova nella bellissima capitale degli aquiloni di Weifang, nello Shandong.

Negli ultimi anni, la forza della fabbrica è cresciuta e si è sviluppata,

e la sua forza di produzione e servizi di qualità hanno vinto gli elogi dei nostri clienti da tutto il mondo.

Diamo il benvenuto a ogni cliente a visitare la fabbrica e ispezionare la qualità del prodotto.

## Certificato



Concentrati su "Qualità e servizio", un servizio one-stop ti aiuta a risparmiare sui costi, a ridurre tutte le preoccupazioni, a girare progetti perfetti.

A. Team di progettazione e ingegneria professionale: soluzione completa per la progettazione di strutture in acciaio B.

Approvvigionamento e fabbricazione di tutto il materiale per l'edilizia prefabbricata.

Abbiamo un team di approvvigionamento professionale per garantire che tutti i materiali siano di buona qualità.

E il nostro funzionamento in fabbrica secondo lo standard ISO / CE / SGS, per assicurarci che la fabbricazione funzioni con l'alta tecnologia.

C. Gestione del sito e supervisione dell'installazione, potremmo inviare i nostri ingegneri per aiutare per la supervisione dell'installazione,

devi solo preparare una squadra che sappia che i normali lavori di costruzione saranno O.K.

## Imballaggio & trasporto

Dettagli dell'imballaggio: 1, consegna dal container 40'HQ. Imballaggio piatto 2, 4 in 1

Dettagli di consegna: 3-20 giorni dopo l'ordine



## I nostri clienti





## FAQ

1, qual è il tuo termine di pagamento?

Deposito del 50% tramite TT, saldo del 50% prima di caricare container con TT; 100% LC a vista (pagamento totale oltre 100.000 USD);

2, che ne dici di spedizione?

Usiamo container 40HQ per spedire la merce; Di solito il container 40HQ può caricare circa 160-180 metri quadrati di casa.

### 3, tempi di consegna?

Dipende da MOQ, di solito possiamo organizzare la spedizione circa 10 giorni dopo il deposito ricevuto.

### 4, come installare?

Di solito forniremo il disegno dell'installazione e, se necessario, forniremo anche il video dell'installazione.

### 5, puoi inviare lavoratori per aiutarmi a costruire casa?

Considerando il costo del lavoro, la sicurezza e le questioni relative ai visti, ti consigliamo di inviare uno o due ingegneri per guidare e formare il tuo personale.

È necessario fornire biglietti aerei, hotel e pasti e 100 USD al giorno per lo stipendio degli ingegneri.
