HY-P12

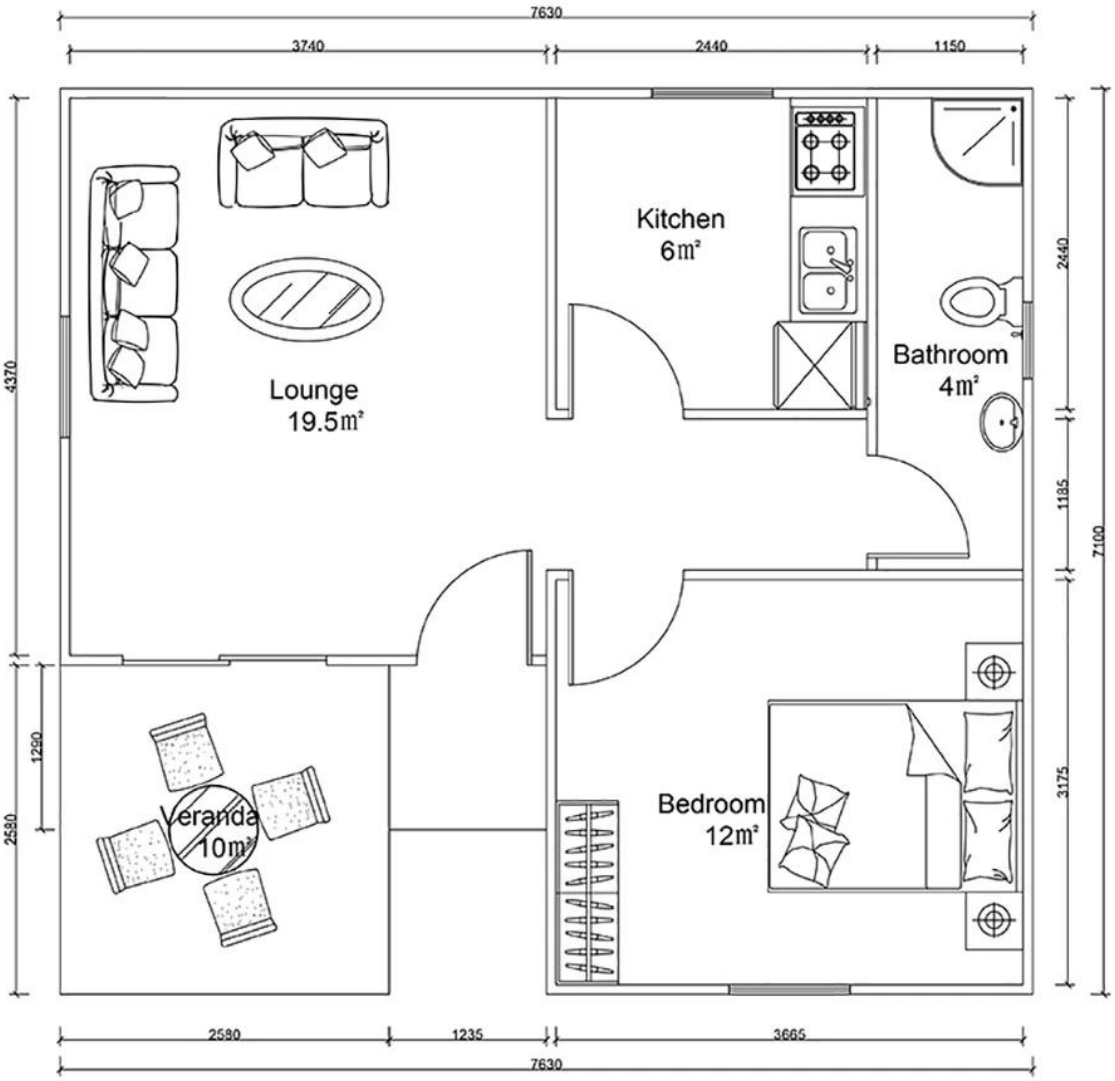
7630
3740
2440
1150
Kitchen
6㎡
Bathroom
4㎡
Lounge
19.5㎡
Veranda
10㎡
Bedroom
12㎡
4370
1290
2580
2440
1185
7100
3175
2580
1235
3665
7630

SCHEDA DI PREVENTIVO DI RIPARTIZIONE

PROGETTO

Articolo	Descrizione	Qtà	Unità
Telaio in acciaio	Arcareccio e trave in acciaio di tipo C, tubo quadrato, canali in acciaio	54.5	□
Muro esterno	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	71	m
Parete interna	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	42	m
Tetto	Pannello sandwich in acciaio colore EPS da 75 mm, pretagliato, con pellicola di protezione	47.52	m
Soffitto	Soffitto in PVC / pvc	54.5	□
	Cartongesso 600 * 600 mm		□
	Pannello in fibrocemento		□
Base / Fondazione	Tavola di compensato		□
	Pavimento in pelle PVC		□
Pavimento	Piastrella in ceramica 800x800mm	54.5	□
Decorazione del tetto	Piastrella in asfalto	71	□
Decorazione murale esterna	Piatto in metallo intagliato		□
	Pannello sospeso in PVC / PVC	95.2	□
Porta	Fuori porta (Porta d'acciaio) 900 * 2000 mm	1	pz
	Porta interna in MDF 800 * 2000 mm / MDF		pz
	Porta in vetro in lega di alluminio	3.2	□
	Porta in vetro PVC		□
	Porta del bagno 800 mm x 2000 mm (impermeabile) / PVC	3	pz
finestre	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 1000 mm (A)	3	pz
	Finestra scorrevole in PVC 950 (L) * 600 mm (A)	1	pz
	Finestra in lega di alluminio		pz
Sistema di scarico	Tubi di scarico, grondaia	38	m
Impianto elettrico		54.5	□
Accessori	Tipi di viti necessarie, sigillante, tegola di colmo, cornicione per pacchetti, scossalina, ferro per canali	54.5	□
