Описание продукта

Heya-2Q02



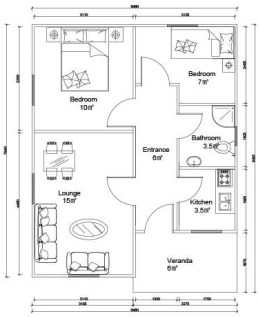

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m^2	53	1.00	T	1.75
fittings		set	53	1.00	m^2	53.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m^2	118.3	1.15	pc	47
External wall unidirectional breath paper		m^2	124	1.20	m^2	149
External wall metal carved board	381*3800*16mm +381*4500*16mm	m^2	118.3	1.15	m^2	136
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m^2	127.5	1.12	pc	50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m^2	127.5	1.12	pc	50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m^2	48.5	1.12	pc	19
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm，12m^2/roll 16Kg/m3	m^2	147.15	1.10	roll	13
Glasswool insulation(under roof)	T75mm，12m^2/roll 16Kg/m3	m^2	53	1.10	roll	5
External wall XPS board	1200*600*40mm	m^2	118.3	1.05	pc	173
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m^2	92	1.15	pc	37
self-paste waterproof coil	T1.5mm，-15°C，20m^2/roll	m^2	92	1.20	roll	6
Roof tile	asphalt tile	m^2	92	1.20	pack	39
Roof ridge tile	asphalt tile	m	10.467	1.10	pack	1
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	42.584	1.10	pc	8
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	42.584	1.10	pc	12
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m^2	25.55	1.20	pc	21
Door & Window						
PVC window		m^2	5.7	1.00	m^2	5.70
PVC door		m^2	10.8	1.00	m^2	10.80
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	52.2	1.10	pc	4
Water&Electric System						
Water Pipes		m^2	53	1.00	m^2	53.00
Electric system	Include weak current,exclude socket/switch/light,etc	m^2	53	1.00	m^2	53.00
Decoration Accessories System		m^2	53	1.00	m^2	53.00
Hardware Accessories System		m^2	53	1.00	m^2	53.00
TOTAL EXW cost		$11,582.60				
TOTAL FOB Qingdao	40ft or 20ft shipping container	$12,482.60				
TOTAL CIF XX		$14,545.02				

Бизнес-презентация

Компания Shandong Heya является лучшим поставщиком китайских сборных решений.

Наша продукция включает в себя сборные дома, контейнеры, мобильные дома, виллы и легкие стальные конструкции.

У нас более 10 лет опыта работы в отрасли, профессиональная команда по производству и закупкам,

поддерживать долгосрочные отношения сотрудничества со многими известными производителями.

Уже завершен проект контейнерного дома для беженцев в Германии, сборный проект классной комнаты в Зимбабве,

Сборный дом Южной Африки, проект сборного дома в деревне в Уругвае и т. Д.

Наша компания стремится стать вашим надежным партнером, вы сосредоточены на своей области знаний,

Позвольте нам помочь вам управлять временным офисом и складом полного решения.

Наш завод находится в прекрасной столице воздушных змеев Вэйфан, Шаньдун.

В последние годы сила фабрики росла и развивалась,

и его производственная мощь и качество услуг были высоко оценены нашими клиентами по всему миру.

Мы приглашаем каждого клиента посетить фабрику и проверить качество продукции.

сертификат

Сосредоточьтесь на «Качество и сервис», уникальная услуга помогает вам сократить расходы, уменьшить все ваши заботы и вернуть идеальный проект

A. Команда разработчиков и профессиональных инженеров: комплексное решение для проектирования стальных конструкций B.

Поставка и изготовление всех материалов для сборных домов.

У нас есть профессиональная команда поставщиков, чтобы убедиться, что все материалы хорошего качества.

И наша фабрика работает в соответствии с ISO / CE / SGS, чтобы гарантировать, что производство работает с высокими технологиями.

C. Управление сайтом и надзор за установкой, мы могли бы отправить наших

инженеров, чтобы помочь в надзоре за установкой,

вам просто нужно подготовить команду, которая знает, что нормальными строительными работами будут О.К.

Упаковка и доставка

Детали упаковки: 1, доставка 40'HQ транспортным контейнером. 2, 4 в 1 плоской упаковке

Детали доставки: через 3-20 дней после заказа

Наши клиенты

HEYA GROUP

HEYA GROUP
HEYA GROUP

часто задаваемые вопросы

1, каков ваш срок оплаты?

Депозит 50% TT, остаток 50% до загрузки контейнера TT; 100% аккредитив в виде (полная оплата свыше 100 000 долларов США);

2, как насчет доставки?

Мы используем контейнер 40HQ для отправки товара; Как правило, контейнер 40HQ может загрузить около 160 до 180 квадратных метров дома.

3, время доставки?

Зависит от MOQ, как правило, мы можем организовать доставку около 10 дней после получения депозита.

4, как установить?

В общем, мы предоставляем установочный чертеж и, при необходимости, также предоставляем монтажное видео.

5, вы можете отправить работников, чтобы помочь мне построить дом?

Учитывая затраты на рабочую силу, безопасность и визу, мы рекомендуем направить одного или двух инженеров для руководства и обучения персонала.

Вы должны предоставить авиабилеты, гостиницу и питание, а также 100 долларов в день на зарплату инженера.
