Описание продукта

Heya-3Q03

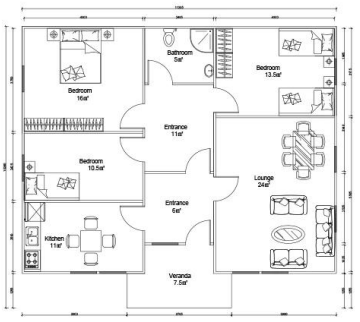

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		㎡	107.00	1.00	T	3.53
fittings		set	107.00	1.00	㎡	107.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	㎡	141.34	1.15	pc	56.44
External wall unidirectional breath paper		㎡	152.74	1.20	㎡	183.29
External wall metal carved board	381*3800*16mm +381*4500*16mm	㎡	141.34	1.15	㎡	162.54
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	㎡	225.00	1.12	pc	87.50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	㎡	225.00	1.12	pc	87.50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	㎡	74.50	1.12	pc	28.97
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm，12㎡/roll 16Kg/m3	㎡	220.42	1.10	roll	20.21
Glasswool insulation(under roof)	T75mm，12㎡/roll 16Kg/m3	㎡	107.00	1.10	roll	9.81
External wall XPS board	1200*600*40mm	㎡	141.34	1.05	pc	206.12
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	㎡	151.26	1.15	pc	60.40
self-paste waterproof coil	T1.5mm，-15℃，20㎡/roll	㎡	151.26	1.20	roll	9.08
Roof tile	asphalt tile	㎡	151.26	1.20	pack	64.83
Roof ridge tile	asphalt tile	m	41.80	1.10	pack	5.75
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	71.00	1.10	pc	13.02
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	71.00	1.10	pc	19.53
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	㎡	42.60	1.20	pc	35.50
Door & Window						
PVC window		㎡	11.40	1.00	㎡	11.40
PVC door		㎡	14.40	1.00	㎡	14.40
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	82.20	1.10	pc	6.28
Water&Electric System						
Water Pipes		㎡	107.00	1.00	㎡	107.00
Electric system	Include weak current,exclude socket/switch/light,etc	㎡	107.00	1.00	㎡	107.00
Decoration Accessories System		㎡	107.00	1.00	㎡	107.00
Hardware Accessories System		㎡	107.00	1.00	㎡	107.00
TOTAL EXW cost		$18,552.04				
TOTAL FOB Qingdao	40ft or 20ft shipping container	$19,452.04				
TOTAL CIF XX		$21,549.30				

Профиль компании

Шаньдун Хейя - лучший китайский производитель сборных жилищных решений.

Наша продукция включает в себя сборные дома, контейнерные дома, мобильные дома, виллы, легкие стальные конструкции.

У нас есть более 10 лет опыта работы в отрасли, профессиональная команда производства и закупок,

Поддерживать долгосрочные отношения сотрудничества со многими известными производителями.

Уже завершен контейнерный проект «Дом беженцев в Германии», сборный проект классной комнаты в Зимбабве,

Сборные дома в Южной Африке, Проект сборных домов в Уругвае и так далее.

Наша компания стремится стать вашим надежным партнером, сосредоточиться на вашей области знаний,

Позвольте нам помочь вам разобраться с временным офисом и складом для комплексного решения.

Наш завод находится в красивой столице Вэйфан, Шаньдун.

В последние годы мощность завода росла и развивалась,

Его производственная мощь и качество обслуживания завоевали похвалу наших клиентов со всего мира.

Приглашаем каждого клиента посетить наш завод и проверить качество продукции.

сертификат

Сосредоточьтесь на «качестве и обслуживании», комплексное обслуживание поможет вам сэкономить средства, уменьшить все ваши проблемы и реализовать идеальный проект.

А. Профессиональная команда инженеров и дизайнеров: комплексное решение для проектирования металлоконструкций

Закупка и изготовление всех материалов для сборных зданий.

У нас есть профессиональная команда по закупкам, чтобы убедиться, что все материалы в хорошем качестве.

Завод работает в соответствии со стандартом ISO / CE / SGS, чтобы убедиться, что

производство работает с использованием высоких технологий.

Управление сайтом и надзор за монтажом, мы можем отправить наших инженеров, чтобы помочь с надзором за монтажом,

Вам просто нужно создать команду, которая знает, что нормальная конструкция будет "ОК".

Упаковка и доставка

Детали упаковки: 1, доставка 40'HQ транспортной тары. 2, 4 в 1 плоской упаковке

Деталь поставки: через 3-20 дней после заказа

Наши клиенты

HEYA GROUP

HEYA GROUP
HEYA GROUP

HEYA GROUP

помощь

1, каков ваш срок оплаты?

50% депозит TT, баланс 50% перед загрузкой контейнера TT. 100% аккредитив в виде (общая сумма платежей превышает 100 000 долларов США);

2, как насчет доставки?

Мы используем контейнер 40HQ для отправки товара. Обычно контейнер 40HQ может загружать около 160-180 квадратных метров дома.

3, время доставки?

Зависит от MOQ, как правило, мы можем организовать отгрузку около 10 дней после получения депозита.

4, как установить?

Мы обычно предоставляем установочный чертеж, и при необходимости мы также предоставляем установочное видео.

5, вы можете отправить работников, чтобы помочь мне построить дом?

Учитывая трудозатраты, безопасность и стоимость визы, мы предлагаем направить одного или двух инженеров для руководства и обучения ваших сотрудников.

Вы должны предоставить авиабилеты, отели, питание и 100 долларов в день, чтобы получить зарплату инженера.
